Trasig s. r. o.
Služby v oblasti dopravního značení

Vyškov, Jízdárenská 590/2a, 682 01
Pobočka: Hodonín tel 736 444 494

T E CH N I C K Á Z P R Á V A
Přechodné dopravní značení

Stavba:	**„REKO MS VELKÉ NĚMČICE – Brněnská“**
Investor:	**MONTGAS a.s., U Kyjovky 3953/3, 695 01 Hodonín**
Stupeň:	**TP**
Vypracoval:	**Souralová Jana**
Zakázkové číslo:	**161/26**
Datum:	**4/2026**

- ✓ **Seznam příloh:**

    1. technická zpráva
    2. celková situace s umístěným dopravním značením

- ✓ **Podklady:**

    mapa uvedené lokality
    prohlídka místa

- ✓ **Řešení:**

Dokumentace řeší návrh přechodného dopravního značení při stavbě „REKO MS VELKÉ NĚMČICE – Brněnská“. Práce budou probíhat výkopem v komunikaci a chodníku podél sil. II/425.

Práce budou probíhat v rámci jednotlivých etap. Při provádění výkopových prací bude pracovní místo osazeno dopravními značkami A15 „práce na silnici“ spolu s B20a „nejvyšší povolená rychlost“, Z4a a Z4b „směrová zábrana“ spolu s výstražným světlem S7, A10 „semafor“, IP22 „změna organizace v dopravě“ a provoz bude řízen semafory. Při provádění prací v chodníku budou umístěny značky B30 „zákaz vstupu chodců“ spolu se zábranou Z2 „zábrana pro označení uzavírky“. Pro vstup do nemovitostí budou použity pochozí lávky. Průjezdní šířka bude vždy min. 3m.

Návrh dopravního značení vyplývá ze zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno, TP 65) a ze zásad pro přechodné dopravní značení (CDV Brno, TP 66) přizpůsobených na místní podmínky a dopravní význam komunikací dotčených stavbou.

Dopravní značky svým tvarem budou odpovídat ČSN EN 12899-1, budou v reflexním (retroreflexnim) provedení v základní velikosti a budou umístěny na sloupcích s červenými a bílými pruhy o šířce 100 mm. Uchycení dopravních značek včetně podstavců bude schváleného typu. Dopravní značky budou umístěny na sloupcích tak, aby spodní okraj nejníže umístěné značky byl minimálně 600mm nad vozovkou. Značky budou umístěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformacím, posunutí, pootočení, a byly dostatečně vidět.

4/2026	
Vypracoval: Souralová Jana	
Kreslil: Souralová Jana	
Č. zakázky : 161/26	Číslo výkresu: 1
Zakázka: Přechodné dopravní značení v rámci stavby „REKO MS VELKÉ NĚMČICE - Brněnská"	

Trasig s.r.o.
Služby v oblasti dopravního značení

VELKÉ NĚMČICE

Délka prac.místa do 80m,
průjezdní šířka min. 3m.

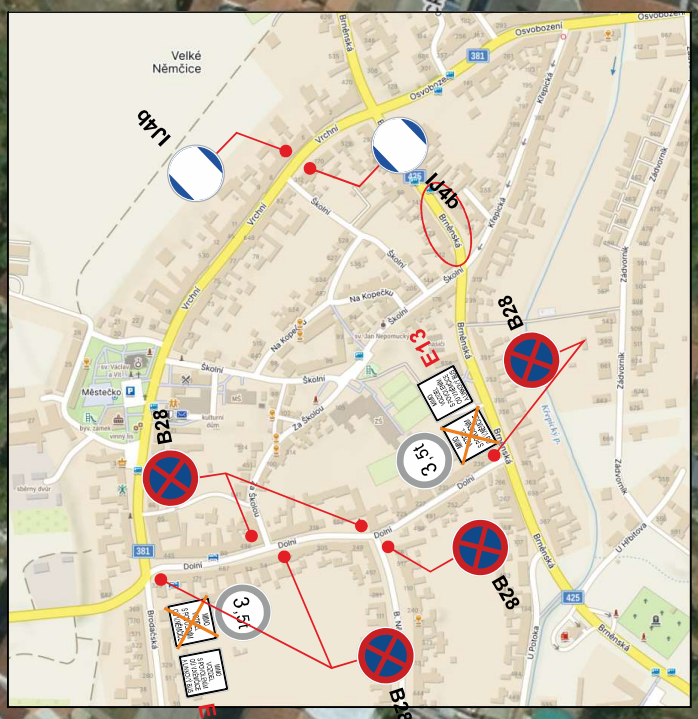

Přechodné DZ
Stávající DZ
Uzavřená plocha

1.5. - 31.5.2026

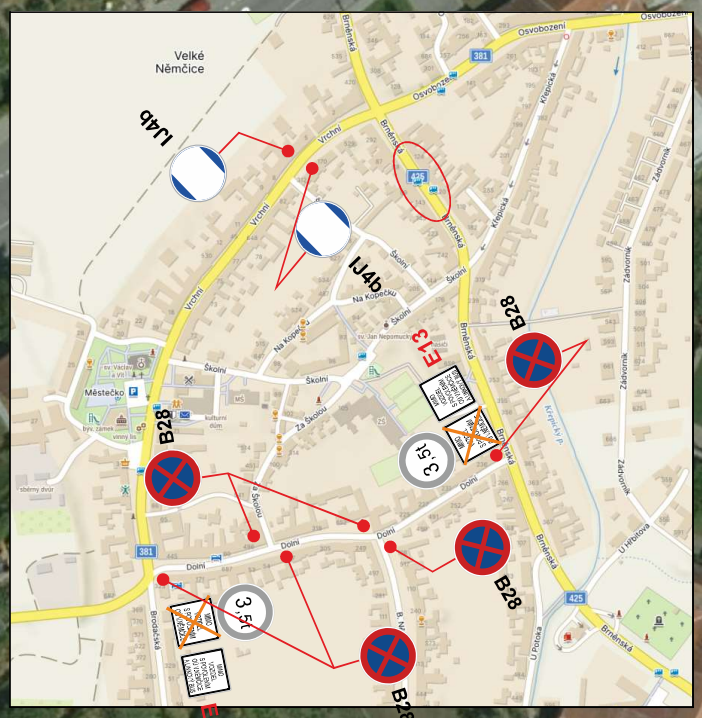

Brněnská
Osvobození
Vrchní
Školní
Na Kopečku
Křepická
III/425
V5
STOP
A15
E7b
B20a
A10
B20b
Semafor
ZÓNA 30
P

Délka prac.místa do 70m,
průjezdní šířka min. 3m.

1.6. - 21.6.2026

Přechodné DZ

Stávající DZ

Uzavřená plocha

4/2026	
Vypracoval: Souralová Jana	
Kreslil: Souralová Jana	
Č. zakázky : 161/26	Číslo výkresu: 2
Zakázka: Přechodné dopravní značení v rámci stavby „REKO MS VELKÉ NĚMČICE - Brněnská"	VELKÉ NĚMČICE

Trasig s.r.o.
Služby v oblasti dopravního značení

4/2026	
Vypracoval: Souralová Jana	
Kreslil: Souralová Jana	
Č. zakázky : 161/26	Číslo výkresu: 3
Zakázka: Přechodné dopravní značení v rámci stavby „REKO MS VELKÉ NĚMČICE - Brněnská”	VELKÉ NĚMČICE

Trasig s.r.o.
Služby v oblasti dopravního značení

Délka prac.místa do 50m, průjezdní šířka min. 3m.

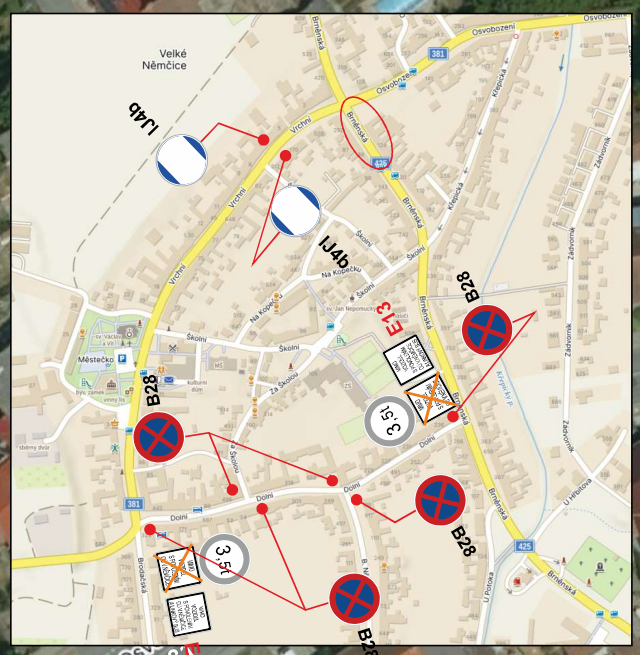

Brněnská
II/425
Osvobození
II/381
Vrchní
Školní
Křepická
Semafor
STOP
A10
A15
E7b
E13
ST 22
B1
B20a
C4b
V5
Z1
ZÓNA 30

Přechodné DZ
Stávající DZ
Uzavřená plocha

22.6. - 12.7.2026

13.7. - 24.7.2026 - pokládka balené
3 dny v daném termínu

4/2026		Trasig s.r.o. Služby v oblasti dopravního značení
Vypracoval:	Souralová Jana	
Kreslil:	Souralová Jana	
Č. zakázky : 161/26	Číslo výkresu: 4	VELKÉ NĚMČICE
Zakázka:	Přechodné dopravní značení v rámci stavby „REKO MS VELKÉ NĚMČICE - Brněnská"	

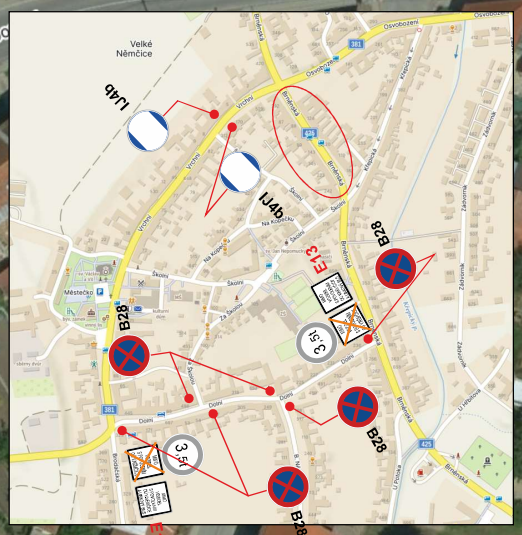

Délka prac.místa do 200m,
průjezdní šířka min. 3m.

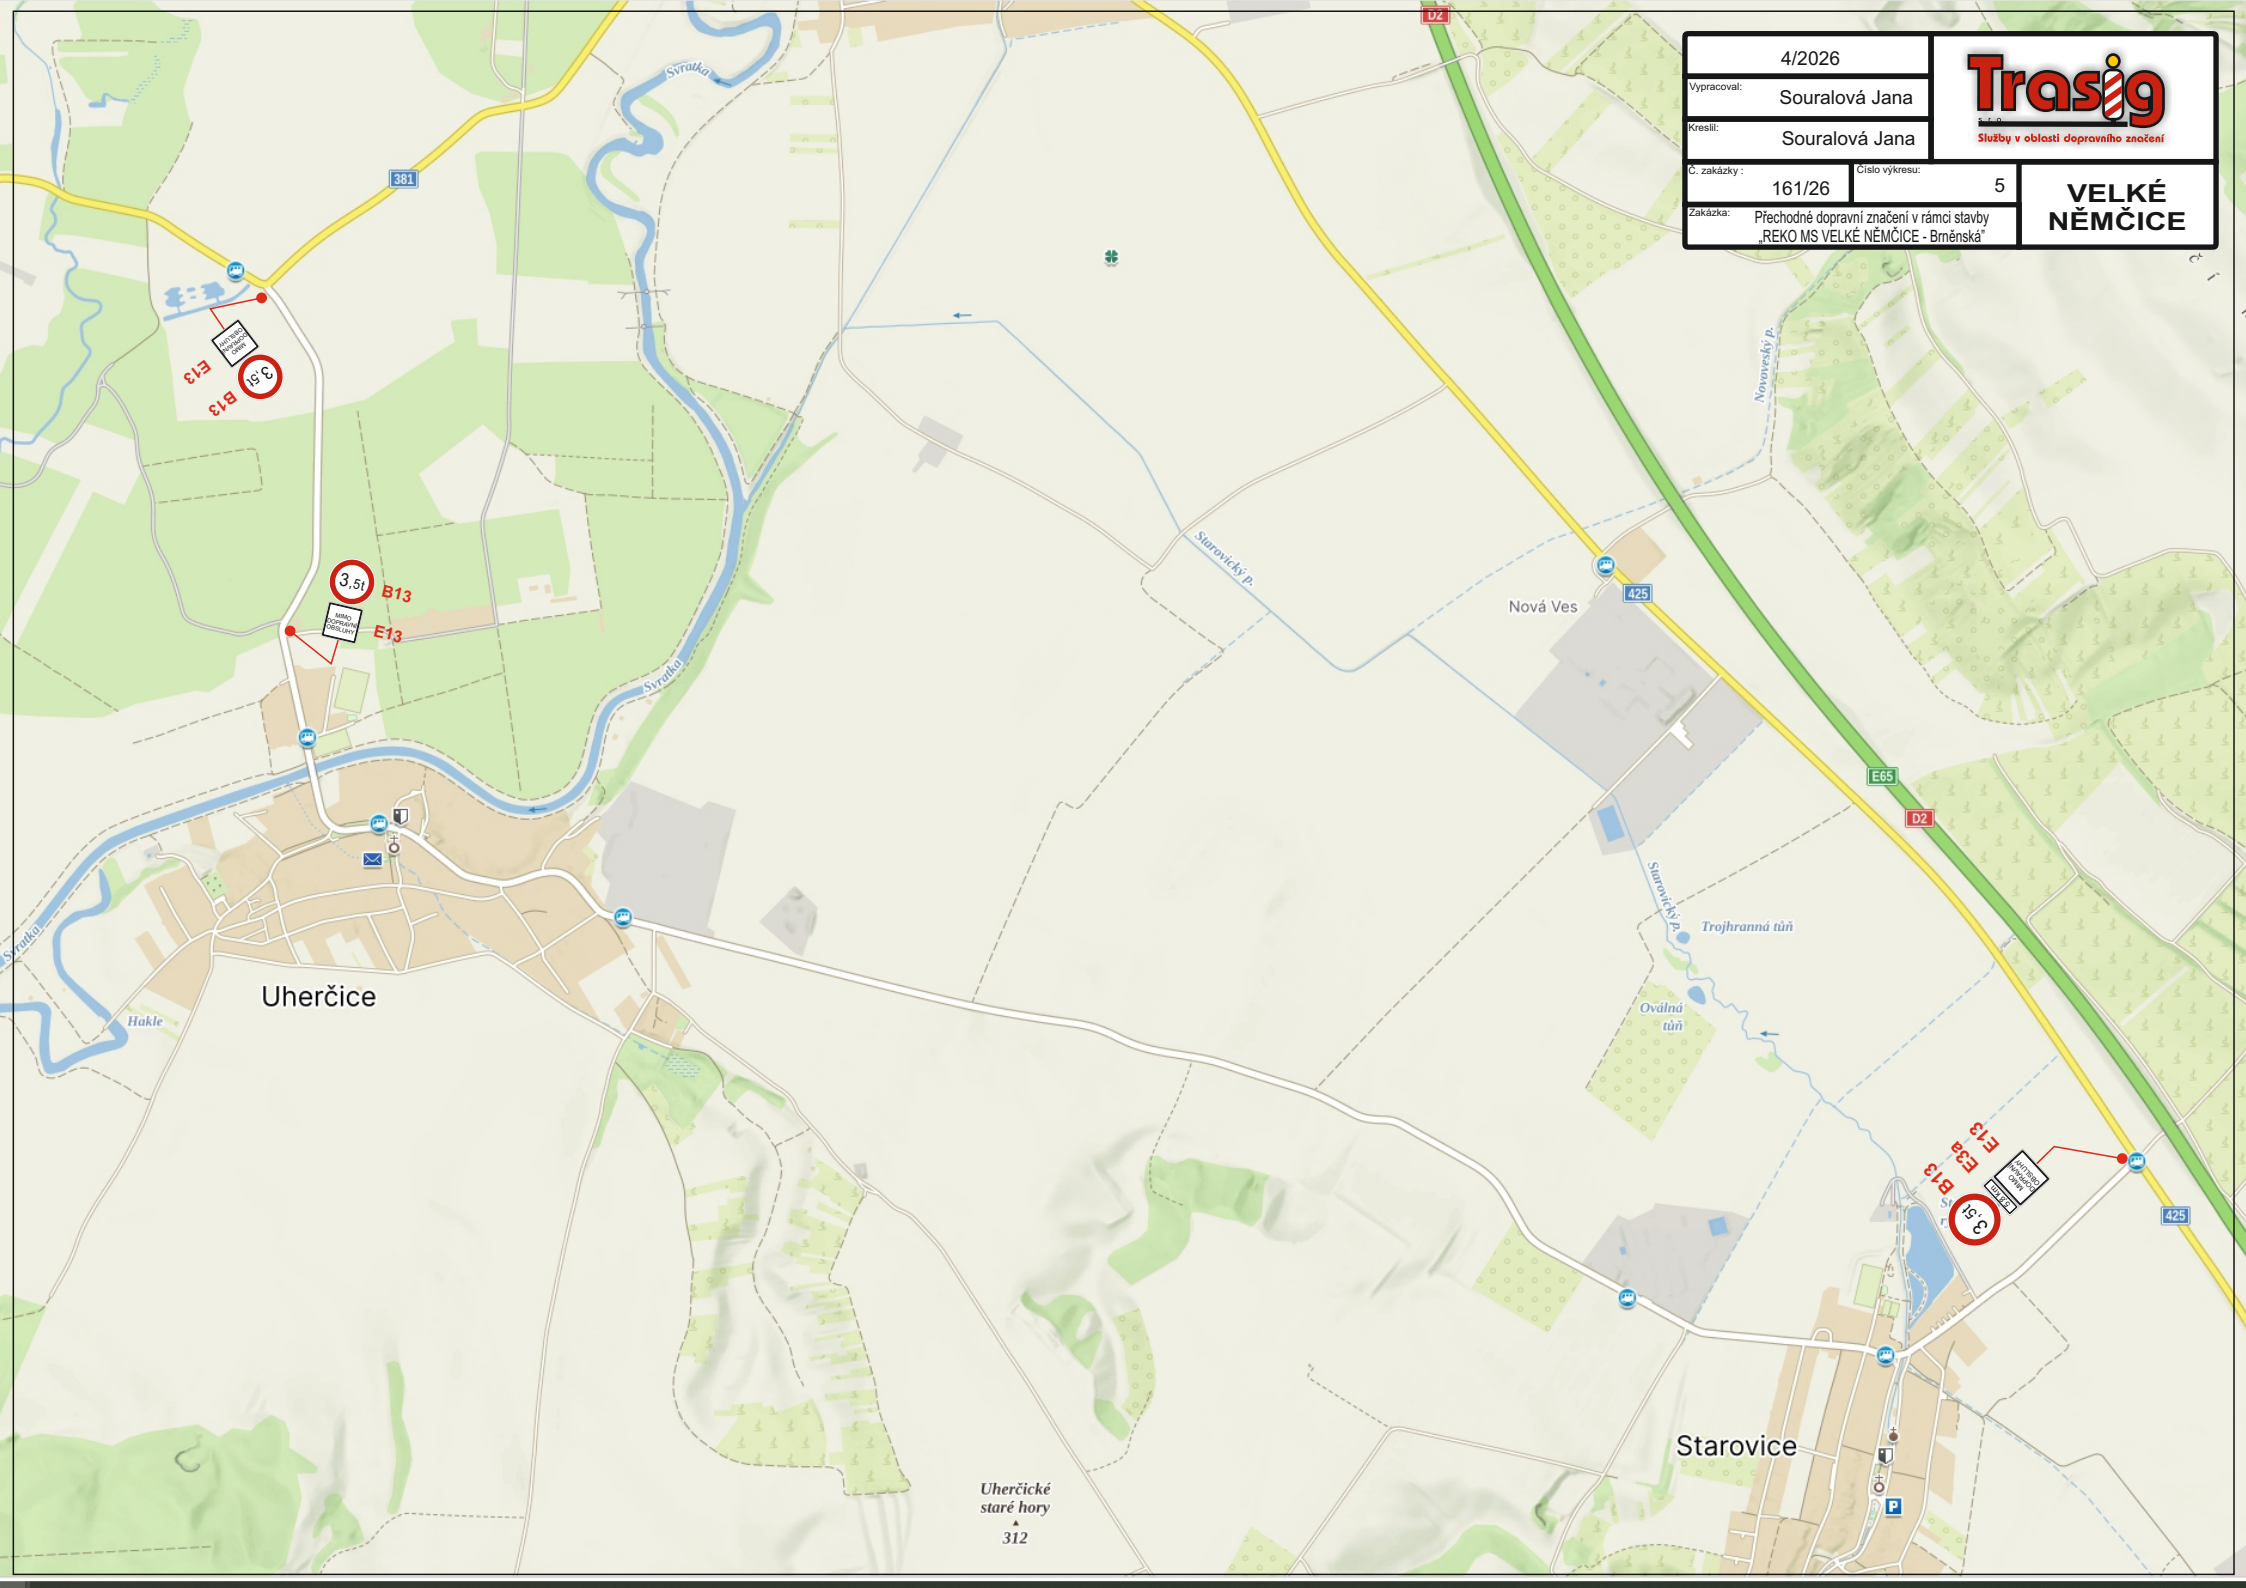
4/2026
Vypracoval: Souralová Jana
Kresilil: Souralová Jana
Č. zakázky : 161/26
Číslo výkresu: 5
Zakázka: Přechodné dopravní značení v rámci stavby „REKO MS VELKÉ NĚMČICE - Brněnská"
Trasig
Služby v oblasti dopravního značení
VELKÉ NĚMČICE
381
425
E65
D2
D2
Svratka
Starovický p.
Novovský p.
Nová Ves
Uherčice
Hakle
Trojhranná tůň
Oválná tůň
Starovice
Uherčické staré hory
312
B13
E13
3,5t
B13
E13
3,5t
B13
E13a
E13
3,5t

Vzorový list pracovního místa do 30m v chodníku

CHODNÍK

CHODNÍK

Z2

B30

30m

B30

Z2

4/2026		Trasig Služby v oblasti dopravního značení	
Vypracoval: Souralová Jana			
Kreslil: Souralová Jana			
Č. zakázky : 161/26	Číslo výkresu: vzor.list	VELKÉ NĚMČICE	
Zakázka: Přechodné dopravní značení v rámci stavby „REKO MS VELKÉ NĚMČICE - Brněnská"			
